



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

**RECUPERO, RIUSO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DELL'IMMOBILE "PALAZZO COVA-ADAGLIO" PER DESTINARLO
A SEDE SCOLASTICA PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI
PRIMO GRADO – MURO PERIMETRALE DI CONFINE E
RECINZIONE ESTERNA**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Casale Monferrato lì 19 MAR. 2018

IL R.U.P.

Ing. Alessandro Ravazzotto



IL PROGETTISTA

Geom. Davide Cantamessa

Arch. Paolo Pappacoda

INDICAZIONI SUL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

L'intervento oggetto della presente relazione dovrà essere necessariamente attuato in zone di intervento, secondo le necessità e le priorità stabilite dall'Amministrazione appaltante.

Si possono pertanto fin d'ora individuare delle zone di intervento e le relative priorità, secondo quanto anche indicato nell'allegata tavola grafica : più precisamente si riepilogano in ordine di importanza e attesa di attuazione

ZONA “A” : Cancelli pedonali e carraio esistenti da recuperare e restaurare

Questa lavorazione assume priorità assoluta pertanto sarà la prima da attuare.

Si prevede :

- la rimozione dei manufatti esistenti ed il loro trasporto all'officina designata dall'appaltatore per il restauro
- l'apposizione sulle specchiature rimaste aperte di recinzione provvisoria prefabbricata metallica a chiusura delle stesse, fissa su due delle tre aperture, e mobile su una delle stesse così da consentire il transito pedonale e l'accesso all'area di cantiere
- la sistemazione delle parti murarie (pilastri di sostegno dei cancelli)
- il riposizionamento dei manufatti metallici restaurati e verniciati

ZONA “E” : Cancelli carraio su via Musso da sostituire

Questa lavorazione assume priorità al pari della zona “A”

Si prevede :

- la rimozione del cancello carraio esistente, e il trasporto del materiale di risulta a P.D.
- La realizzazione delle opere murarie (travi e pilastri) atti al sostegno del nuovo cancello carraio da realizzare
- la realizzazione del nuovo cancello carraio in ferro come previsto in progetto e la sua posa in opera

ZONE “B” : Specchiature di recinzione su P.zza San Francesco da realizzare con nuovi manufatti in ferro

Si prevede :

- la demolizione e rimozione dei tamponamenti ad elementi in laterizio aperti esistenti
- il ripristino delle parti murarie da mantenere in opera secondo quanto previsto dal progetto
- la realizzazione delle nuove specchiature di recinzione metalliche ed il loro posizionamento in opera

ZONE “C” : Specchiature di recinzione murarie cieche da ristrutturare in opera sulla P.zza San Francesco

Si prevede :


- la ristrutturazione mediante interventi di pulizia, ripristino intonaci, ecc. secondo quanto indicato in progetto

ZONE “D” : Specchiature di recinzione murarie cieche da ristrutturare in opera sulle via Musso e via Vigliani

Si prevede :

- la ristrutturazione mediante interventi di pulizia, ripristino intonaci, ecc. secondo quanto indicato in progetto

E' fatta tassativa consegna che i lavori previsti in zona “A”, “B” ed “E” devono essere ultimati entro 60 gg. n.c. Decorrenti dalla data di consegna delle opere.

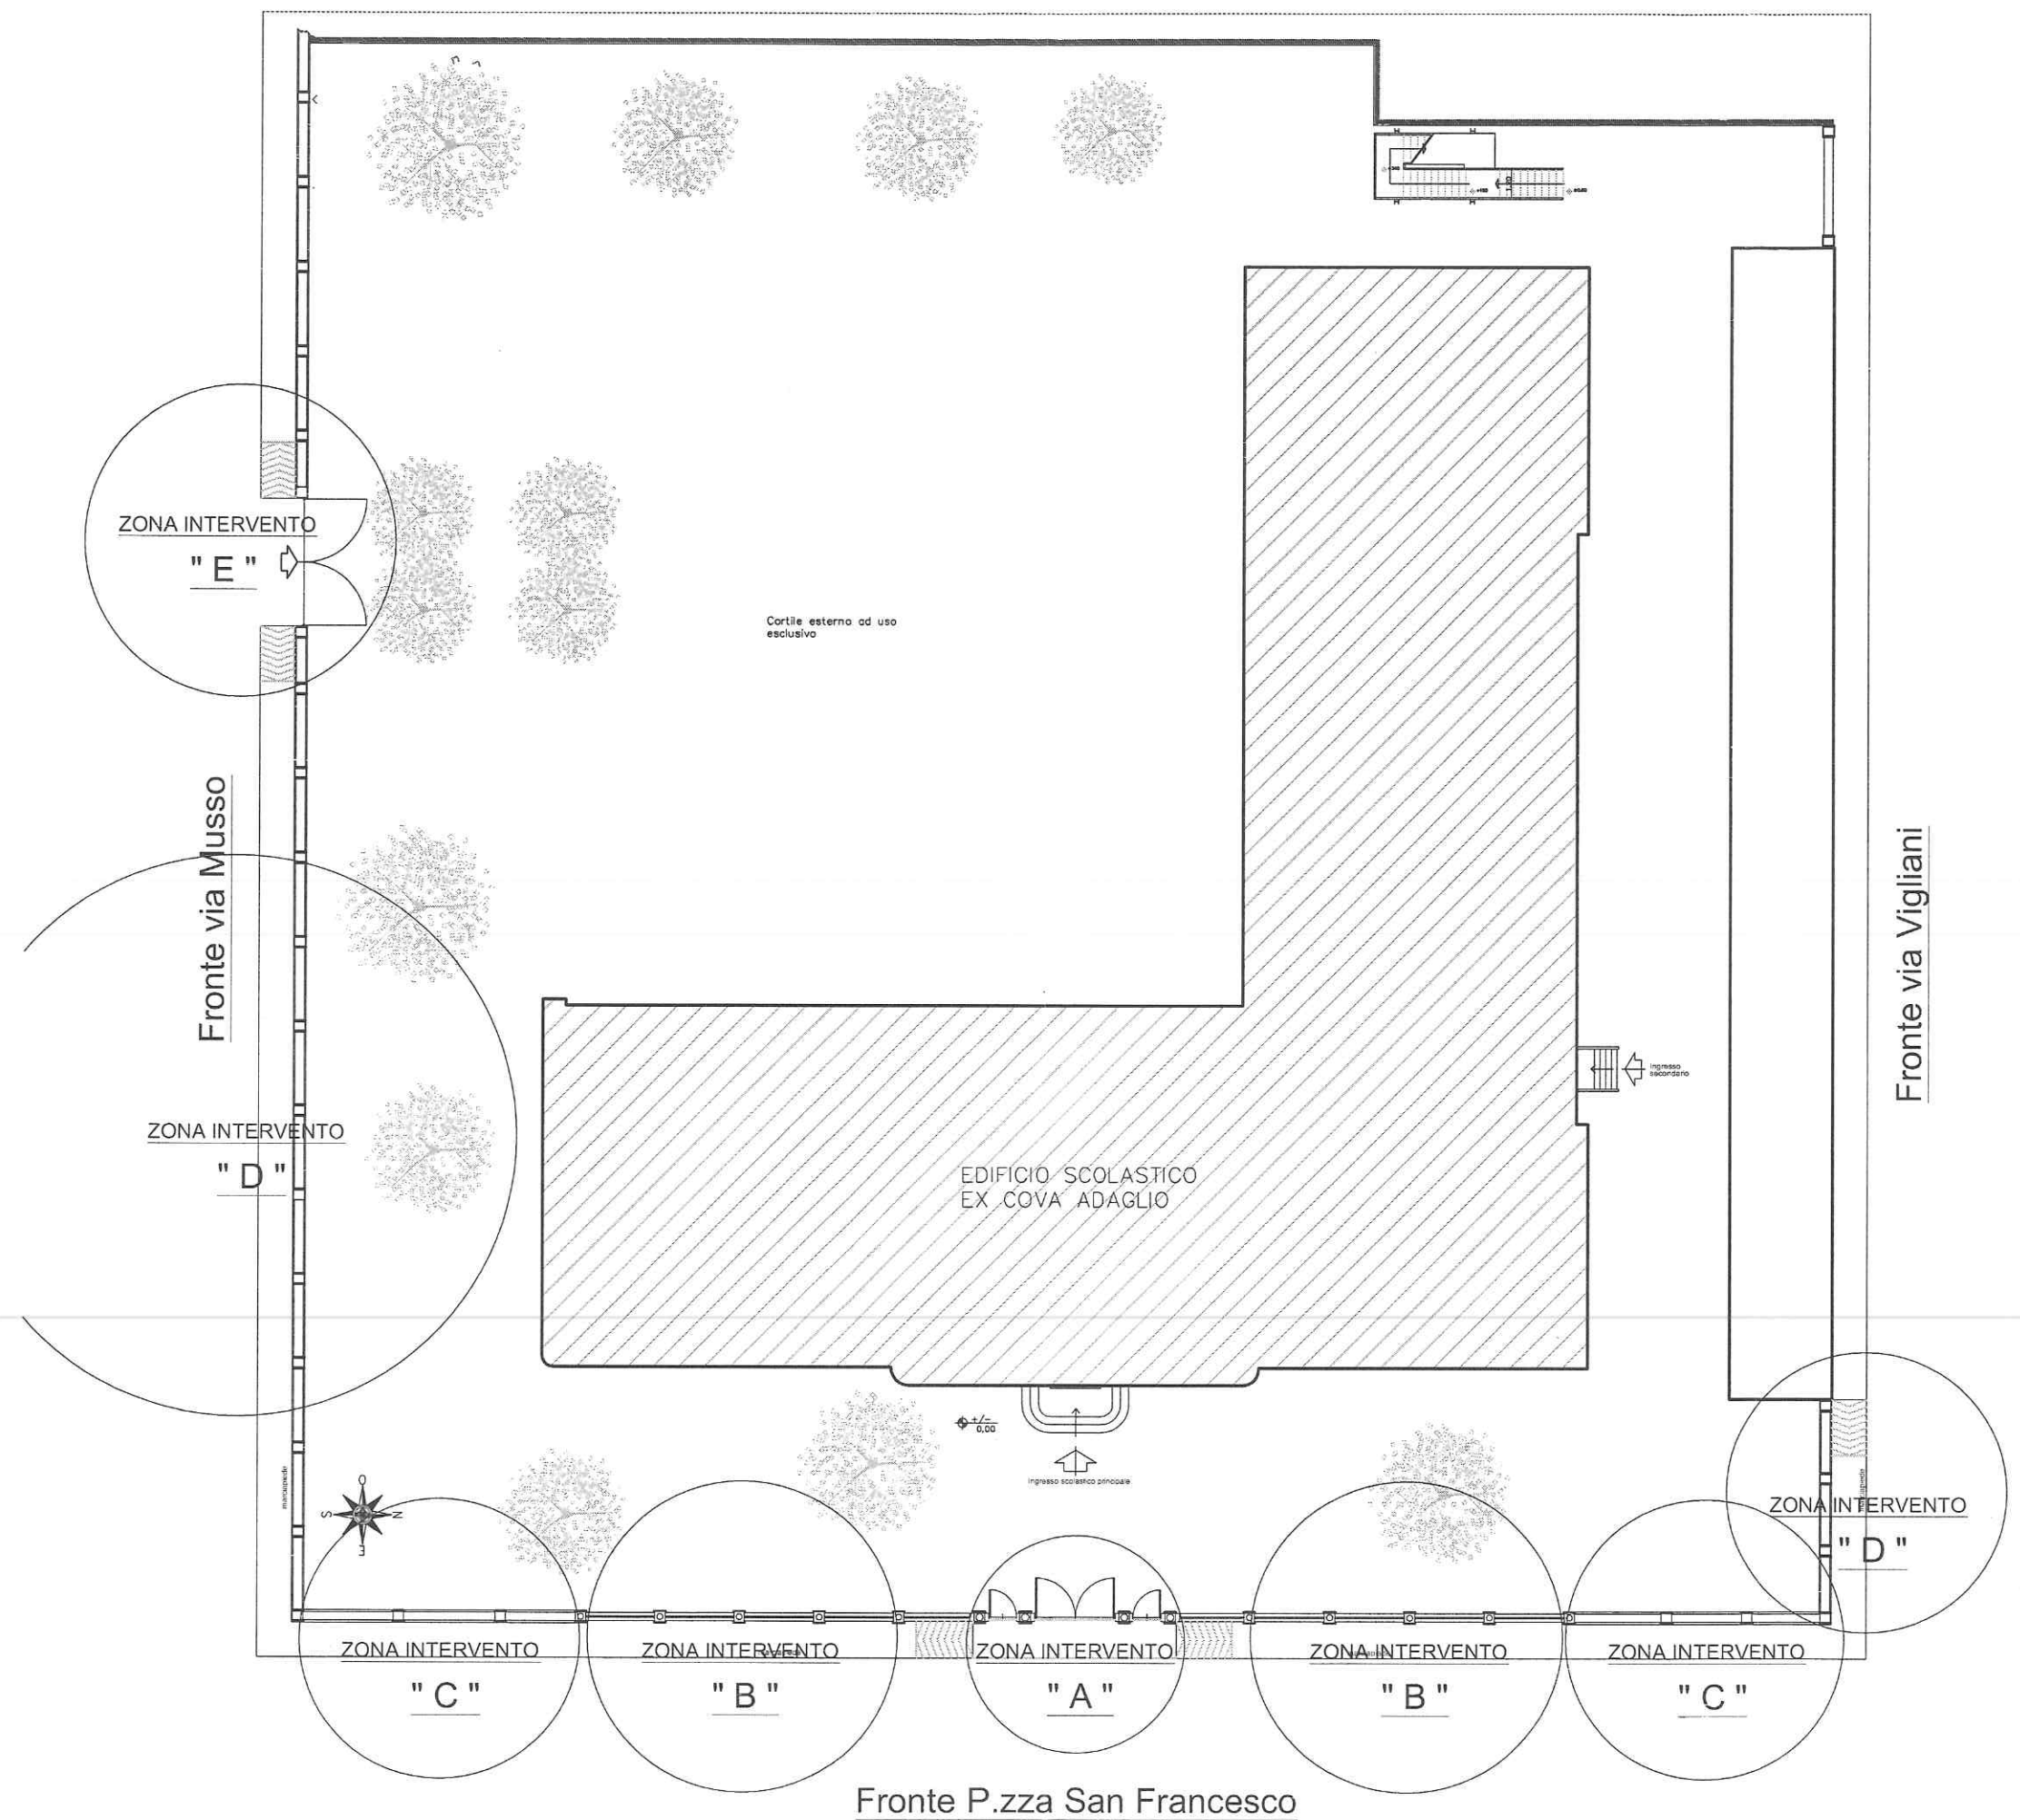

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO

RECUPERO, RIUSO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE PALAZZO "COVA ADAGLIO" - MURO PERIMETRALE DI CONFIN E RECINZIONE

Cronoprogramma dei lavori

[illegible]
