

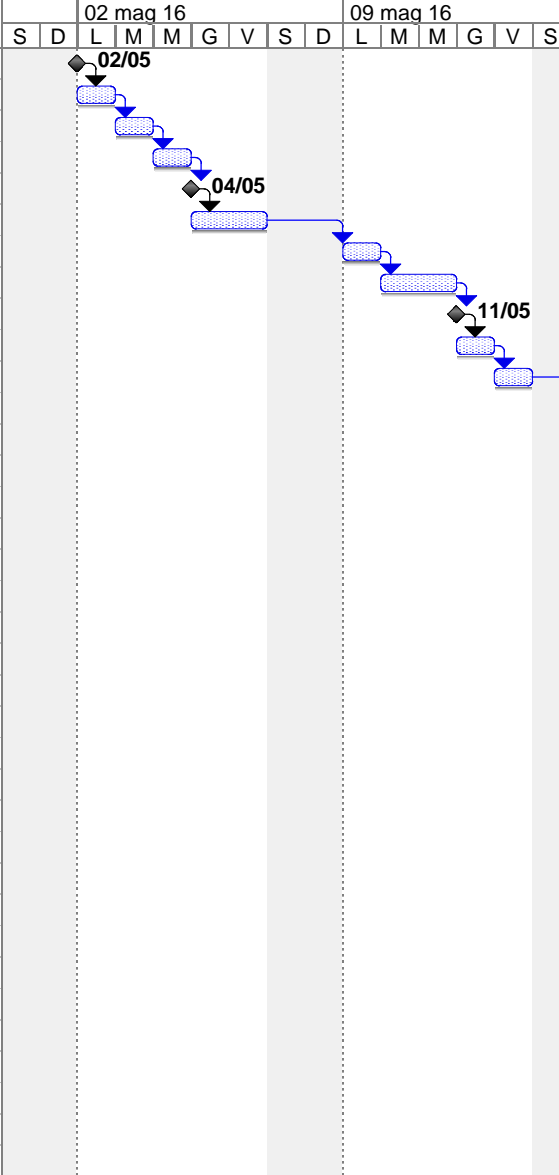


ID		Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	02 mag 16							09 mag 16						
							S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V
1		<b>STRADA DEL RABELLONE</b>	0 g	lun 02/05/16	lun 02/05/16															
2		Preparazione pavimentazione	1 g	lun 02/05/16	lun 02/05/16	1														
3		Stesa emulsione bituminosa	1 g	mar 03/05/16	mar 03/05/16	2														
4		Formazione nuova pavimentazione bituminosa	1 g	mer 04/05/16	mer 04/05/16	3														
5		<b>FRAZIONE RONCAGLIA TRATTO STRAD PER SAN MARTINO</b>	0 g	mer 04/05/16	mer 04/05/16	4														
6		Preparazione pavimentazione	2 g	gio 05/05/16	ven 06/05/16	5														
7		Stesa emulsione bituminosa	1 g	lun 09/05/16	lun 09/05/16	6														
8		Formazione nuova pavimentazione bituminosa	2 g	mar 10/05/16	mer 11/05/16	7														
9		<b>FRAZIONE RONCAGLIA TRATTO STRADA DELLA LUPA</b>	0 g	mer 11/05/16	mer 11/05/16	8														
10		Preparazione pavimentazione	1 g	gio 12/05/16	gio 12/05/16	9														
11		Stesa emulsione bituminosa	1 g	ven 13/05/16	ven 13/05/16	10														
12		Formazione nuova pavimentazione bituminosa	2 g	lun 16/05/16	mar 17/05/16	11														
13		<b>FRAZIONE RONCAGLIA STRADA DEI BAZZANI</b>	0 g	mar 17/05/16	mar 17/05/16	12														
14		Preparazione pavimentazione	1 g	mer 18/05/16	mer 18/05/16	13														
15		Stesa emulsione bituminosa	1 g	gio 19/05/16	gio 19/05/16	14														
16		Formazione nuova pavimentazione bituminosa	1 g	ven 20/05/16	ven 20/05/16	15														
17		<b>VIA SETIFICIO</b>	0 g	ven 20/05/16	ven 20/05/16	16														
18		Realizzazione fognatura parcheggio	3 g	lun 23/05/16	mer 25/05/16	17														
19		Esecuzione scotico e regolarizzazione pendenze parcheggio	1 g	gio 26/05/16	gio 26/05/16	18														
20		Realizzazione tout venant bitumato parcheggio	1 g	ven 27/05/16	ven 27/05/16	19														
21		Scarifica sede stradale	2 g	lun 30/05/16	mar 31/05/16	20														
22		Formazione nuovo tappeto d'usura parcheggio	1 g	mer 01/06/16	mer 01/06/16	21														
23		Formazione nuovo tappeto d'usura sede stradale	1 g	gio 02/06/16	gio 02/06/16	22														
24		<b>VIA DESANA</b>	0 g	gio 02/06/16	gio 02/06/16	23														
25		Demolizione pavimentazione bituminosa esistente	3 g	ven 03/06/16	mar 07/06/16	24														
26		Realizzzione linea principale I.P.	5 g	mer 08/06/16	mar 14/06/16	25														
27		Realizzazione nuovi plinti per pali I.P.	2 g	mer 15/06/16	gio 16/06/16	26														
28		Formazione di pozzetti completi di chiusino in ghisa	2 g	ven 17/06/16	lun 20/06/16	27														
29		Riempimento scavi	1 g	mar 21/06/16	mar 21/06/16	28														
30		Regolarizzazione sezione trasversale	1 g	mer 22/06/16	mer 22/06/16	29														
31		Realizzazione tout venant bitumato	2 g	gio 23/06/16	ven 24/06/16	30														
32		Formazione nuovo tappeto d'usura sede stradale	1 g	lun 27/06/16	lun 27/06/16	31														
33		<b>TRATTI SALITA SANT'ANNA</b>	0 g	lun 27/06/16	lun 27/06/16	32														
34		Preparazione pavimentazione	1 g	mar 28/06/16	mar 28/06/16	33														
35		Stesa emulsione bituminosa	1 g	mer 29/06/16	mer 29/06/16	34														
36		Formazione nuova pavimentazione bituminosa	2 g	gio 30/06/16	ven 01/07/16	35														



Pagina 1

