



PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

AREE DI EMERGENZA
AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA SPEDITIVA
DI CENSIMENTO

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA

Id. Scheda n. 2

Data(gg/mm/aa)

Compilatore

Nome FILIBERTO Cognome MANFREDI

Qualifica Professionale (Titolo di Studio): INGEGNERE

☒ Libero Professionista ☐ Dipendente Comunale / Unione Comuni
per conto del Comune / Unione Comuni / C.O.M. di CASALE MONFERRATO

Firma _____

Tipologia Area:

- 1 ☐ Area di Attesa o di Raccolta (Meeting Point)
2 ☐ Area di Ammassamento Materiali e Mezzi
3 ☒ Area di Ricovero o di Accoglienza: **Campo sportivo comunale S.Germano**
3.1 ☐ Area adibita ad altre funzioni, ma con infrastrutture primarie esistenti (Struttura Ricettiva)
3.1.1 **Struttura Residenziale:**
☐ Abitazione Privata
☐ Abitazione Collettiva
☐ Impianto Sportivo
☐ Altro _____
3.1.2 **Struttura Turistica:**
☐ Albergo / Hotel / Pensione
☐ Ostello / Affittacamere
☐ B&B / Agriturismo
☐ Campeggio / Area attrezzata
☐ Altro _____
3.2 ☐ Struttura impropria, ma comunque idonea ad accogliere popolazione previa integrazione con servizi ausiliari
3.2.1 **Struttura dell'Istruzione:**
☐ Asilo
☐ Scuola (Elementare/Media/Superiore)
☐ Collegio
☐ Convitto
☐ Altro _____
3.2.2 **Struttura Sanitaria:**
☐ Ospedale
☐ Presidio Sanitario
☐ Casa di cura
☐ Casa di riposo
☐ Altro _____
3.2.3 **Struttura Religiosa:**
☐ Chiesa
☐ Convento
☐ Edificio di culto
☐ Altro _____
3.2.4 **Struttura Civile:**
☐ Municipio
☐ Sede Comunale decentrata
☐ Struttura Comunale collettiva
☐ Altro _____
3.3 ☒ Area potenzialmente utilizzabile
☒ per Tendopoli
☐ per Moduli Abitativi (Provvisori - Containers - o SemiPermanenti - Prefabbricati)
3.4 ☐ Campo nomadi/profughi esistente
☐ Tendopoli
☐ Roulottopoli

Regione PIEMONTE

Provincia ALESSANDRIA (AL)

Comune CASALE MONFERRATO

C.O.M. di riferimento n° 1

Cod. Istat _____

Cod. Istat _____

Cod. Istat 006039

Dati Catastali

Allegato _____

Foglio 86

Particelle 561

Sub _____

Frazione/Località CASALE MONFERRATO

Indirizzo STRADA BASSOTTI

Num. Civico C.A.P. 15033

Coordinate geografiche (ED50 - UTM fuso 32-33)

E _____

Fuso

N _____

3 2

Proprietà

☒ Pubblica

☐ Privata

Area sottoposta a convenzione

☐ Sì

☐ No

Proprietario

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Utilizzatore

Area formalmente prevista nel Piano Comunale/Intercomunale di Protezione Civile

☒ Sì

☐ No

Referente Area

SARTORIO PIER LUIGI

Funzione/Ruolo GESTORE Tel./Cell.360 672785



Referente: arch. M. Piccione

marco.piccione@provincia.alessandria.it

1

Rev. Ottobre 2013




PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

AREE DI EMERGENZA
AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA SPEDITIVA
DI CENSIMENTO

SEZIONE 2 - INQUADR. GEOGRAFICO, URBANISTICO E AMB. DELL'AREA (SUPERFICIE)/STRUTTURA (EDIFICIO)

INQUADRAMENTO P.R.G. / C.T.R.

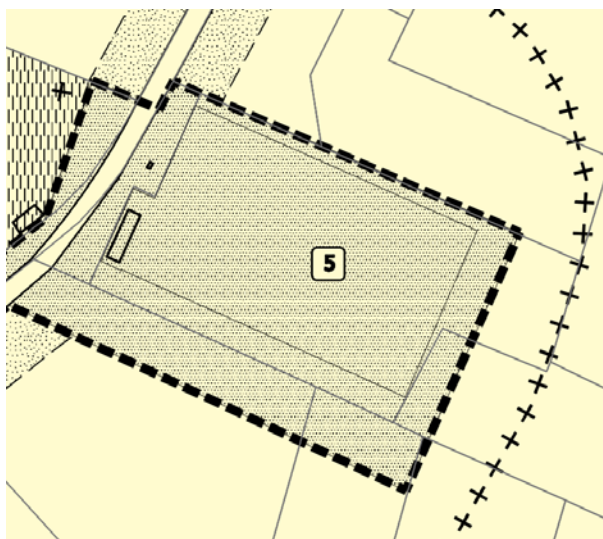

INQUADRAMENTO CATASTALE



| Destinazione d'uso (uso prevalente) | | Aree con preminente destinazione a pubblici servizi afferenti la residenza (campo sportivo) | | | | | | | |
|---|------|---|------|------|--|--|---|------|------|
| Zona da P.R.G. | Bsr | | | | | Soggetta a esproprio | | | |
| Vincolo archeologico | | O Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | | | O Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | | |
| Vincolo paesaggistico | | O Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | | | O Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | | |
| Esondabilità (Rischio idrologico) | | O Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | | | Presenza dissesti franosi (Rischio geologico) | | | |
| Rischio P.A.I. (se perimetro) | | | | | | Pericolosità P.A.I. (se perimetro) | | | |
| Frane | O R1 | O R2 | O R3 | O R4 | | Frane | O P1 | O P2 | O P3 |
| Esondazioni | O R1 | O R2 | O R3 | O R4 | | Esondazioni | O P1 | O P2 | O P3 |
| Rischio Incidente Rilevante/N.B.C.R. | | O Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | | | Rischio Incendi Boschivi | O Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | |
| Prossimità elettrodotti/gasdotti/acquedotti o linee aeree | | O Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | | | Pericolo eventuale crollo strutture vicinali | O Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | |
| Prossimità a discariche / imp. depurazione | | O Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | | | Prossimità a magazzini/serbatoi liquidi/gas infiammabili | O Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | |
| Presenza colture pregiate | | O Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | | | Altro | | | |



Referente: arch. M. Piccione

marco.piccione@provincia.alessandria.it



Rev. Ottobre 2013



PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

AREE DI EMERGENZA
AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA SPEDITIVA
DI CENSIMENTO

| SEZIONE 5 PRE-DIMENSIONAMENTO AREA DI RICOVERO | |
|--|--|
| PER TENDOPOLI | PER MODULI ABITATIVI PROVVISORI (CONTAINERS) |
| Popolazione stimata da ricoverare | |
| N. tende da prevedersi <input type="text"/> (rif. n. 1 tenda MPI 88 dim. 6 x 4.5 = 6 p. = 27 mq)) | N. containers ISO 20 da prevedersi <input type="text"/> (rif. n. 1 container ISO20 dim. 6x3 = 1/2 p. =18 mq)) Area di pertinenza min. pari a 70 mq – spaziatura 2 m |
| N. “moduli base” da prevedersi <input type="text"/> (rif. “1 modulo base” = n. 4 tende MPI 88 = 24 p.) Area di pertinenza pari a 225 mq – spaziatura tra tende di 4.5 m | N. containers ISO 40 da prevedersi <input type="text"/> (rif. n. 1 container ISO40 dim. 12x3 = 4/8 p. =36 mq)) Area di pertinenza min. pari a 113 mq – spaziatura 2 m |
| N. “moduli 32” equivalenti: 2 (rif. 1 “modulo 32” = n. 8 “moduli base” = 192 p.) Area di pertinenza pari a 3.025 mq = a metà campo da calcio 55x55 – spaziatura tra moduli base di 4 m | N. containers ISO 40dis per disabili da prevedersi <input type="text"/> (rif. n. 1 container ISO40dis dim. 12x3 = 1 disabile =36 mq)) Area di pertinenza min pari a 113 mq – spaziatura 2 m |
| N. tende uso segreteria/infermeria/vigilanza- da prevedersi 1 (rif. 1 tenda dim 12x2.5 ogni 2 “moduli 32” = 384 p.= 30 mq) | N. moduli a schiera ISO40 da prevedersi 30 (blocchi di n.2 containers ISO40 con pertinenza pari a 226 mq) |
| N. tende uso mensa/chiesa/scuola/ricreativo da prevedersi 1 (rif. 1 tenda dim. 12x15 di ogni tipo ogni 2 “moduli 32” = 384 p. = 180 mq) | N. moduli a corte “Tipo 2” da prevedersi <input type="text"/> (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 557 mq) |
| N. docce da prevedersi (rif. 1 doccia ogni 30÷50 p.) 8 | N. moduli a corte “Tipo 3” da prevedersi <input type="text"/> (n. 2 ISO40 + n. 3 ISO20 con area di pertinenza pari a 557 mq) |
| N. WC da prevedersi (rif. 1 WC ogni 6 ÷10 p.) 40 | |
| N. lavabi da prevedersi (rif. 1 lavabo ogni 10 p.) 40 | N. moduli a corte “Tipo 4” da prevedersi <input type="text"/> (n. 5 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 770 mq) |
| N. Container servizi igienici da prevedersi <input type="text"/> (rif. 1 container dim. 7x3 = n. 6 lavabi + n. 6 WC + n. 2 docce = 21 mq) | |
| N. KW da prevedersi 300 (rif. 4 KW min. ogni tenda pari a 1 generatore 150 KW ogni “modulo 32”) | N. moduli a corte “Tipo 5” da prevedersi <input type="text"/> (n. 4 ISO40 + n. 2 ISO20 con area di pertinenza pari a 799 mq) |
| Dotazione idrica min.da prevedersi (rif. 10+5 = 15 lt/p) 8640 | N. moduli a disp. varia “Tipo 6” da prevedersi <input type="text"/> (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 476.5 mq) |
| N. punti acqua potabile da prevedersi (rif. 1 punto ogni 80÷100p.) 57 | |
| N. centri rifiuti da prevedersi (rif. 1 centro ogni 40÷50 p.) 12 | N. moduli a disp. varia “Tipo 7” da prevedersi <input type="text"/> (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 566 mq) |
| N. estintori a polvere da prevedersi 96 (rif. 1 estintore ogni “modulo base” = 4 tende) | N. moduli a disp. varia “Tipo 7” da prevedersi <input type="text"/> (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 565.5 mq) |

Pop max ricoverabile: 857 persone

pop max ricoverabile 477 persone



Referente: arch. M. Piccione

marco.piccione@provincia.alessandria.it
