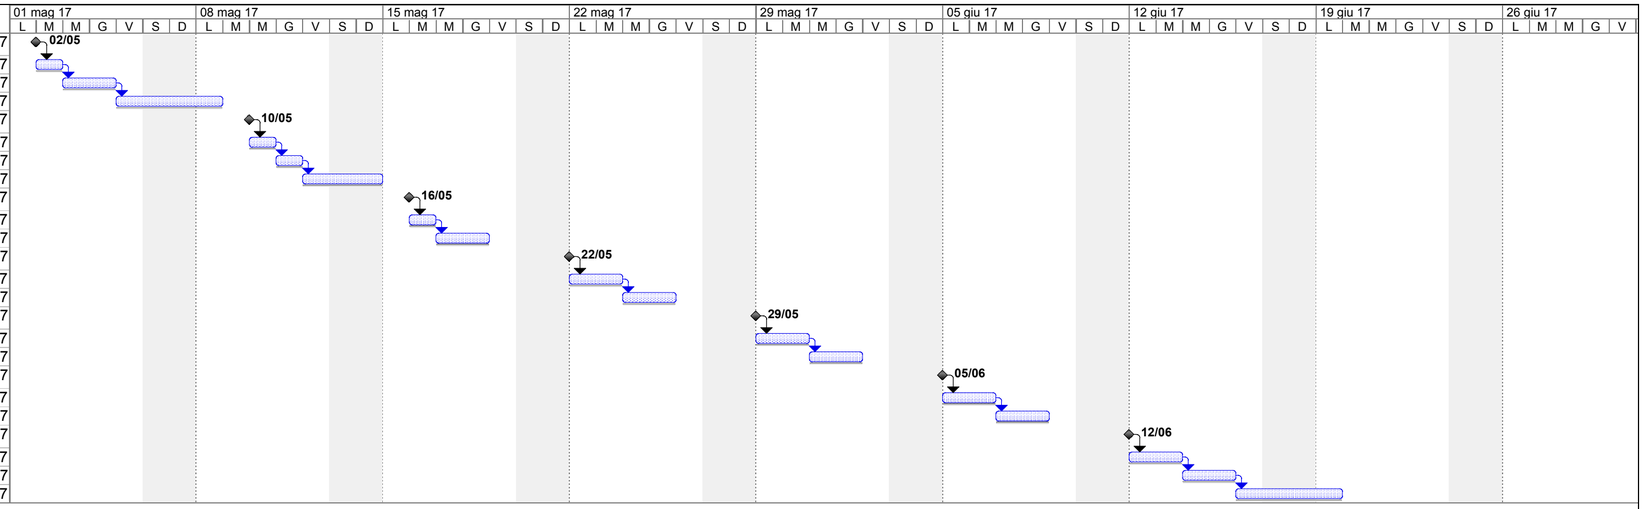ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**VIA VISCONTI**	0 g	mar 02/05/17	mar 02/05/17
2	Preparazione pavimentazione	1 g	mar 02/05/17	mer 03/05/17
3	Risagomatura con binder	2 g	mer 03/05/17	ven 05/05/17
4	Realizzazione nuovo tappeto d'usura	2 g	ven 05/05/17	mar 09/05/17
5	**TRATTO STRADA BASSOTTI**	0 g	mer 10/05/17	mer 10/05/17
6	Preparazione pavimentazione	1 g	mer 10/05/17	gio 11/05/17
7	Risagomatura con binder	1 g	gio 11/05/17	ven 12/05/17
8	Realizzazione nuovo tappeto d'usura	1 g	ven 12/05/17	lun 15/05/17
9	**ROTONDA VIA ADAM STRADA VECCHIA VERCELLI**	0 g	mar 16/05/17	mar 16/05/17
10	Scarifica pavimentazione esistente	1 g	mar 16/05/17	mer 17/05/17
11	Realizzazione nuovo tappeto d'usura	2 g	mer 17/05/17	ven 19/05/17
12	**PONTI SUL PO**	0 g	lun 22/05/17	lun 22/05/17
13	Scarifica pavimentazione esistente	2 g	lun 22/05/17	mer 24/05/17
14	Realizzazione nuovo tappeto d'usura	2 g	mer 24/05/17	ven 26/05/17
15	**ROTONDA PIAZZA BRIGATA CASALE**	0 g	lun 29/05/17	lun 29/05/17
16	Scarifica pavimentazione esistente	2 g	lun 29/05/17	mer 31/05/17
17	Realizzazione nuovo tappeto d'usura	2 g	mer 31/05/17	ven 02/06/17
18	**VIA BERTANA**	0 g	lun 05/06/17	lun 05/06/17
19	Scarifica pavimentazione esistente	2 g	lun 05/06/17	mer 07/06/17
20	Realizzazione nuovo tappeto d'usura	2 g	mer 07/06/17	ven 09/06/17
21	**TRATTI STRADA COMUNALE PER ROLASCO**	0 g	lun 12/06/17	lun 12/06/17
22	Preparazione pavimentazione	2 g	lun 12/06/17	mer 14/06/17
23	Risagomatura con binder	2 g	mer 14/06/17	ven 16/06/17
24	Realizzazione nuovo tappeto d'usura	2 g	ven 16/06/17	mar 20/06/17
